
倉浜衛生施設組合

2027年度　10月　業務予定

項目		日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	合計
		曜日	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
搬入量予測			203	78	25	334	325	145	240	203	78	25	334	325	145	240	203	78	25	334	325	145	240	203	78	25	334	325	145	240	203	78	25	5,706
重量[t]	搬入量		203	78	25	334	325	145	240	203	78	25	334	325	145	240	203	78	25	334	325	145	240	203	78	25	334	325	145	240	203	78	25	5,706
	焼却予定量	1号	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	0	0	0	0	0	2,678
		2号	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	103	0	0	0	0	2,781
		3号	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ごみピット残量（翌日0時）		558	430	249	377	496	435	469	466	338	157	285	404	343	377	374	246	65	193	312	251	285	282	154	-27	101	220	262	502	705	783	808	焼却量合計
焼却	1号炉	立ち上げ																												1	2	3	4	5,459
		運転																																
		立ち下げ																																
	2号炉	立ち上げ																																
		運転																																
		立ち下げ																																
	3号炉	立ち上げ	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123															
		運転	整備工事（120日）														乾燥焚き																	
		立ち下げ																																

全停炉　17日
（10/31　全停電点検）
系統解列
10/27
系統併入
11/14

ごみピットレベル調整期間

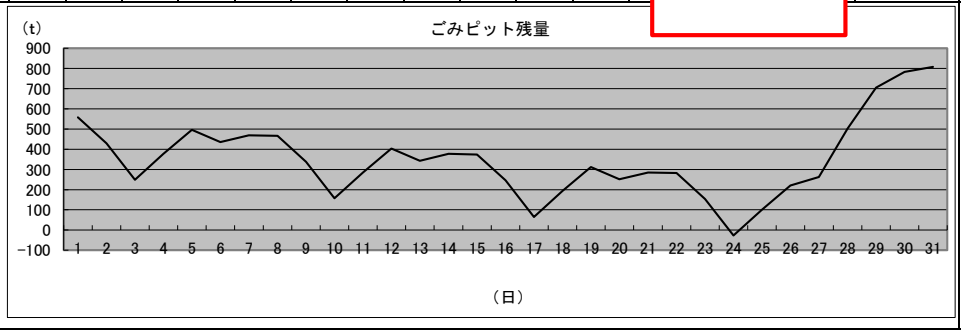

備　考

＊ごみピット残量により変更する場合があります。

※注意※ 搬入推定量　：2024年10月　搬入量参考
焼却予定量　：目標焼却量
ごみピット残量：翌日0時のピット内ごみ重量（搬入推定量、焼却量より算出）

維持管理所長

EBARA

荏原環境プラント株式会社
